

**ANFORDERUNG
EINBRING- & AUFSTELLSERVICE
CHECKLISTE & ÜBERGABEPROTOKOLL**

Email: PK-Versand-Inland@wolf.eu
Tel.: 08751-74-1187
Fax: 08751-74-1613

Vom Besteller auszufüllen:

Webshop Bestellnummer: _____

Betreiber des Gerätes: _____

Standort des Gerätes: _____

Postleitzahl / Ort: _____

Straße: _____

Gebäude / Stockwerk: _____

Name der Kontaktperson: _____

Telefon: _____

Mobil: _____


**Aufstellposition im Raum
ist festgelegt (siehe Skizze)**

**Anschlusskabel am Gerät
mit Schukostecker 3m lang**
(Kabelverlängerung max. 10m,
Querschnitt 3 x 1,5 mm²)

Luftvolumenstrom: 150 - 1200 m³/h
Wenn keine Vorgabe gemacht wird, wird
werksseitig Stufe 4 (690 m³/h) eingestellt.

Stufe

150 m³/h
 385 m³/h
 690 m³/h
 1000 m³/h
 1200 m³/h

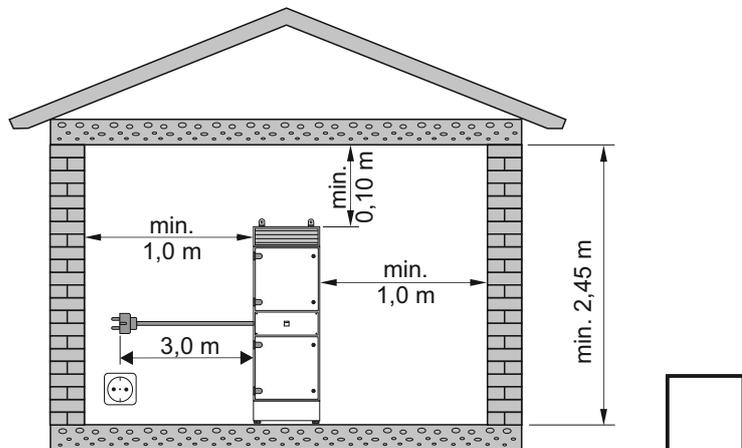

Raumgrundfläche Aufstellraum (m²): _____

Raumhöhe (m): _____

Datum

Name ggf. Firmenstempel

Unterschrift / Signatur

**ANFORDERUNG
EINBRING- & AUFSTELLSERVICE
CHECKLISTE & ÜBERGABEPROTOKOLL**




Email: PK-Versand-Inland@wolf.eu
Tel.: 08751-74-1187
Fax: 08751-74-1613

Vom Aufstellservice auszufüllen:

WOLF-Auftragsnummer: _____

Geräteseriennummer: _____


Demontage und
Montage des
Gerätes aus
Transportgründen,
bei Bedarf
(z.B. Aufzug)

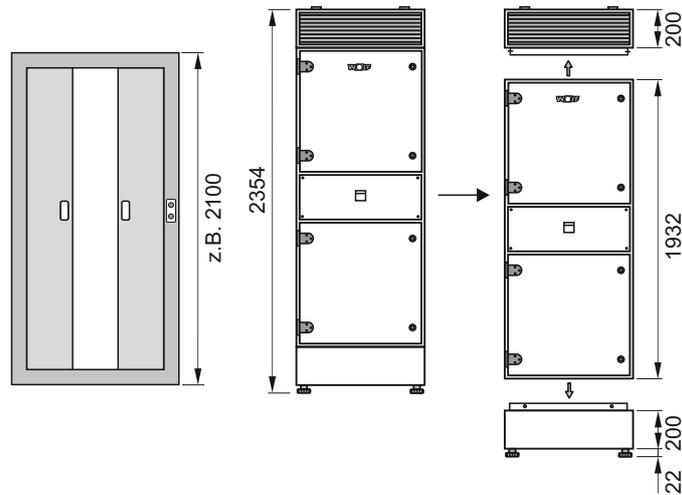


Gewicht verpackt: 218 kg
Gewicht unverpackt: 195 kg



Kippsicherung

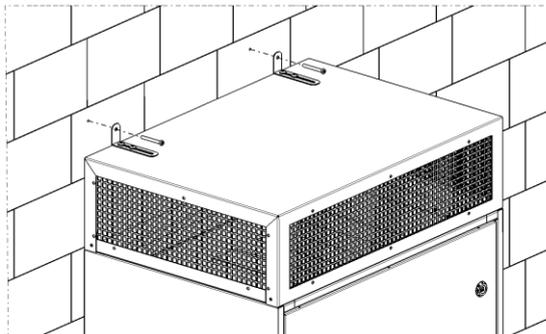

Schutzfolie HEPA-Filter
entfernen

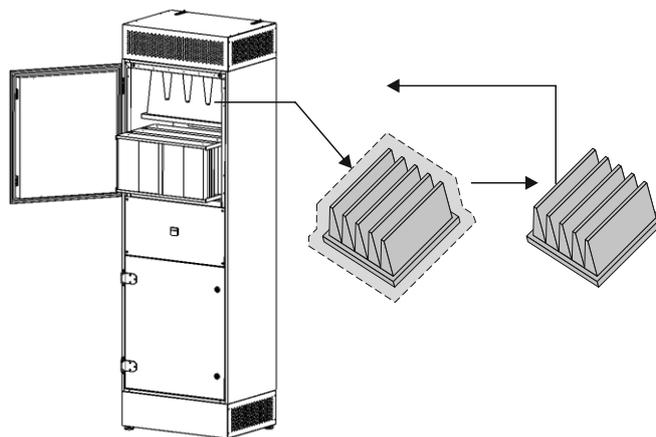

**ANFORDERUNG
EINBRING- & AUFSTELLSERVICE
CHECKLISTE & ÜBERGABEPROTOKOLL**






Email: PK-Versand-Inland@wolf.eu
Tel.: 08751-74-1187
Fax: 08751-74-1613

Vom Aufstellservice auszufüllen:

Einweisung

Betriebsschalter, Boost-Taster, Differenzdruckmanometer, Potentiometer, Wartung



Luftvolumenstrom:

Bei der Geräteaufstellung am Potentiometer einzustellender bzw. eingestellter Luftvolumenstrom, entsprechend des Raumvolumens des Aufstellraumes und der gewünschten Luftwechselrate und den Vorgaben des Bestellers (Seite 1).

Raumgrundfläche (m²): _____ Raumvolumen (m³): _____

Raumhöhe (m): _____



(Siehe Betriebsanleitung Seite 21)

Wenn keine Vorgabe gemacht wurde, ist werkseitig Stufe 4 (690 m³/h) eingestellt.

Stufe


 150 m³/h

 385 m³/h

 690 m³/h

 1000 m³/h

 1200 m³/h

Beispiel:

Raumgrundfläche (6 m x 8 m): 48 m²
Raumhöhe: 3 m
Raumvolumen: 144 m³
Gewünschte Luftwechselrate: 4-fach
Einzustellender Luftvolumenstrom: 144m³ x 4 = 720 m³/h

Betriebs-
anleitung



und

Revisionstür-
schlüssel



übergeben

Datum

Name eingewiesene Person

Unterschrift / Signatur

Name ggf. Firmenstempel

Unterschrift / Signatur
